

**Stadt Gladbeck**

**Der Bürgermeister**

**Amt für Schule und Sport / Grünflächenamt**

# **Sportanlage Jahnplatz**

- ***Dokumentation der Erdarbeiten im Zuge der Kampfmittelräumung***
- ***Dokumentation der bisherigen Sanierungsarbeiten***

## **Beauftragte Firma:**

- **Alfred Ulenberg, Freier Landschaftsarchitekt**  
AKNW - Tel: 02834/8081 - Internet: [www.ulenberg.de](http://www.ulenberg.de)

## **Weitere Projektbeteiligte:**

- **Firma GBL, Bodenabtrag für Kampfmittelräumung**
- **Firma Knese, Sportplatzarbeiten**

Auf den folgenden Seiten sehen Sie die von der Firma Ulenberg erstellte Chronologie der Arbeiten sowie ergänzende Fotos

# Übersicht des Baustellenablaufs auf dem Jahnsportplatz in Gladbeck

- 22.06.2001 Einweisung und Arbeitsbeginn der Firma GBL
- 29.06.2001 Sportplatzaufbau auf 1. Hälfte abgetragen.  
Fa. GBL unterbricht die Arbeiten.
- 02.07.2001 Kampfmittelräumdienst (KRD) nimmt Arbeit auf.
- 04.07.2001 Nach Aussage des KRD müssen die obersten 50 cm  
zusätzlich abgetragen werden.
- 05.07.2001 Fa. GBL nimmt die Arbeiten wieder auf. Es werden nun  
auf der 1. Platzhälfte, weitere 50cm abgegraben.
- 09.07.2001 Fund der 1. Bombe
- 16.07.2001 Fund der 2. Bombe
- 18.07.2001 Fund der 3. Bombe
- 19.07.2001 Abtrag auf der 2. Hälfte des Sportplatzes wird begonnen.


## Übersicht des Baustellenablaufs auf dem Jahnsportplatz in Gladbeck Fortsetzung

- 25.07.2001            Entschärfung der Bomben. Erst ab jetzt kann auf der 1. Platzhälfte der Boden wieder eingebaut werden.
- 16.08.2001            Der KRD räumt die Baustelle.**
- 24.08.2001            Einweisung Firma Knese.  
Firma GBL baut weiterhin das Material auf der Fläche ein.
- 27.08.2001            Baugrundüberprüfung durch das Labor De Reuter.  
Der Bodengutachter stellt im oberen Bereich des Aufbaus zu geringe Tragfähigkeit fest und schlägt eine Bodenverbesserung vor.  
Fa. GBL muß noch Boden einplanieren, kann aber auf Grund der nassen Witterung nicht arbeiten.
- 26.09.2001            Firma GBL stellt das Probefeld her.
- 02.10.2001            **Der Bodengutachter führt Plattendruckversuche auf dem Probefeld durch. Ergebnis negativ!  
Entweder wird ein Bodenaustausch vorgenommen oder der Boden muss austrocknen.**

## Übersicht des Baustellenablaufs auf dem Jahnsportplatz in Gladbeck Fortsetzung


- 09.10.2001      Firma Knese fängt mit den Arbeiten für die Hauptentwässerung an.
- 22.10.2001      Abnahme des Gewerks der Firma GBL. Firma Knese baut Dränrohre zur Ableitung der großflächigen Wasseransammlungen ein.
- 26.10.2001      Es können keine Erdarbeiten durchgeführt werden, da der Baugrund zu naß ist.  
Firma Knese stellt die Flutlichtfundamente her.
- 31.10.2001      Die Arbeiten werden infolge der Witterung eingestellt.
- 19.11.2001      Es wird mit den Arbeiten für die Stehstufenanlage begonnen.
- 23.11.2001      Die Emscher Lippe Energie verlegt zwei Stromkabel.
- 27.11.2001      Die alten Stromkabel wurden abgeklemmt.
- 03.12.2001      Die Arbeiten müssen aber auf Grund der schlechten Bodenverhältnisse erneut unterbrochen werden.

# Aufzeichnung der Niederschläge in Straelen

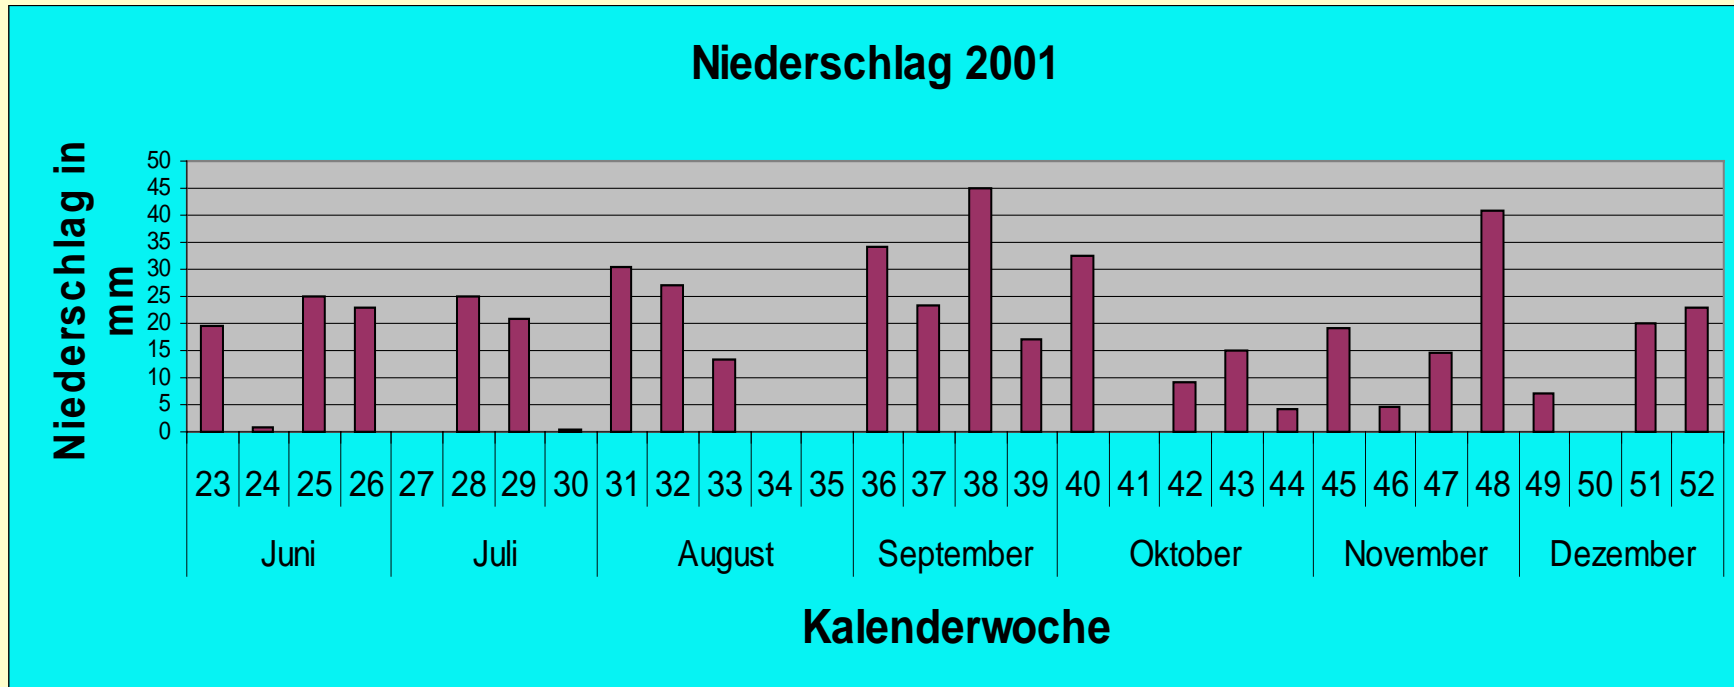

# Aufzeichnung der Niederschläge in Straelen

## Niederschlag im Monat

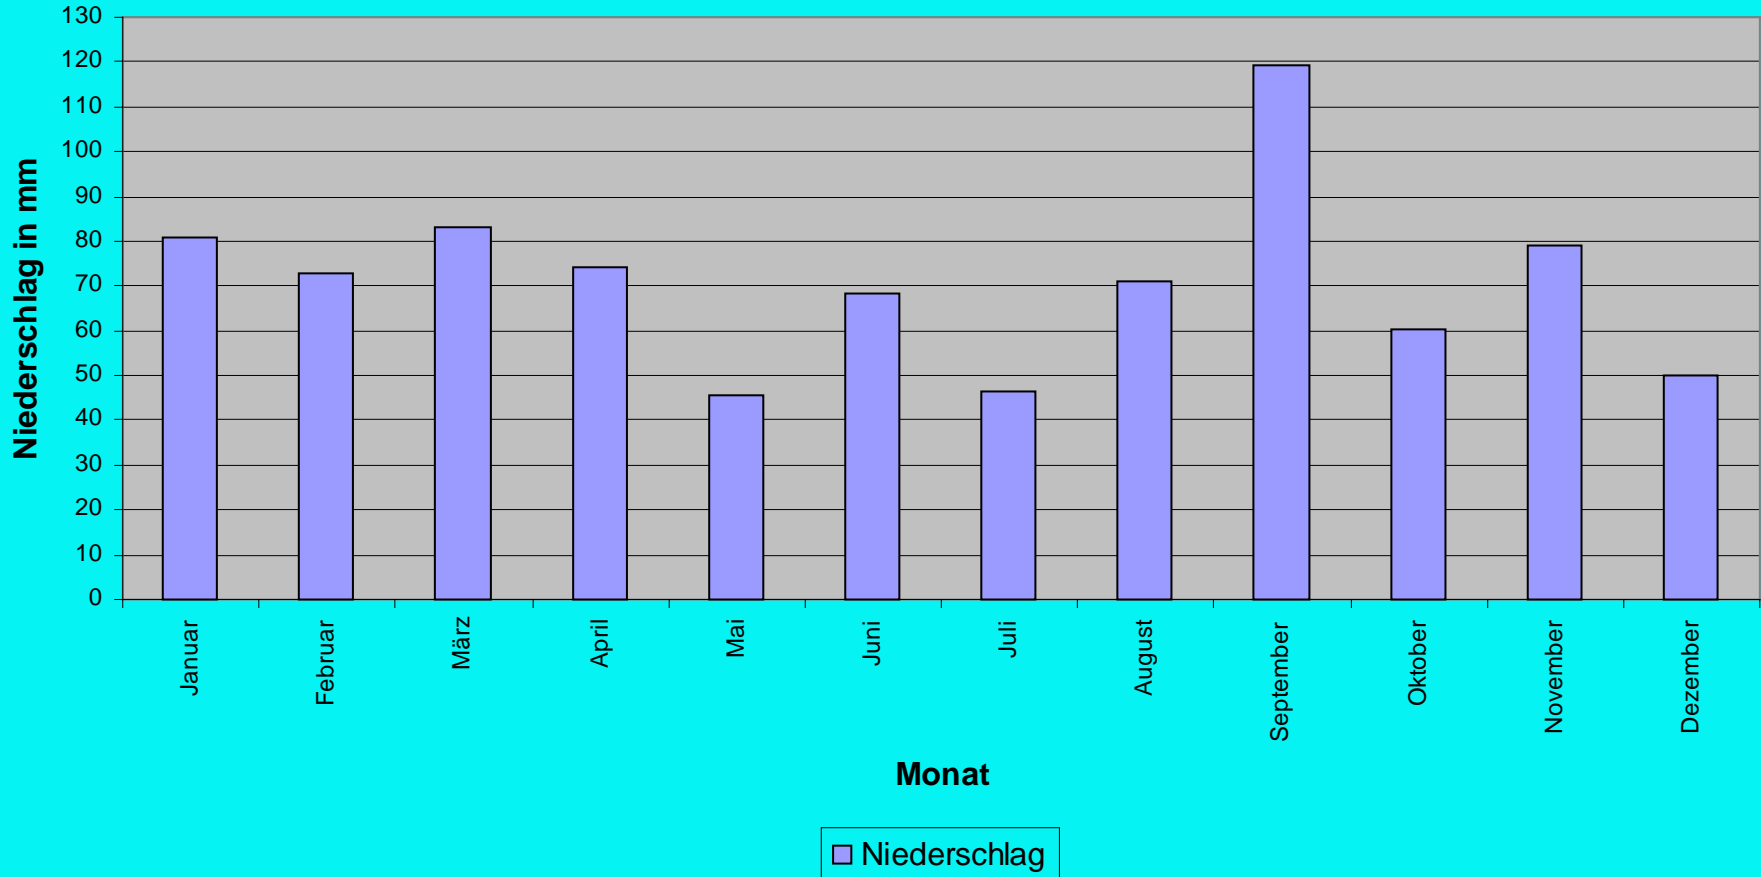

# Bombentrichter 06.07.2001



# Bombentrichter mit stehendem Wasser

## 11.07.2001





# Ansicht einer geräumten Teilfläche 13.07.2001



**Aufgenommener  
alter Hauptkanal  
13.07.2001**



# Fundstelle der 2. Bombe

## 16.07.2001



# Ausschachtungsarbeiten zur Kampfmittelräumung 23.07.2001



# Verfüllung Bombenrichter 09.08.2001



# Aushub Bombenrichter 13.08.2001



# Verfüllung der Bombentrichter 14.08.2001



# Einbau alter Sportplatzaufbau 20.08.2001





# Einbau alter Sportplatzaufbau

## 24.08.2001



# Sportplatzfläche am 26.10.2001



# Fahrspuren 02.10.2001



# Wasseransammlung durch starke Niederschläge im September 2001



**02.10.2001**

# Aushub Flutlichtfundament 21.11.2001



# Kontrollschacht Nr. 2

## 23.11.2001



# Stehstufenanlage 03.12.2001



# Fahrspuren 05.12.2001





# Planieren der Fahrspuren 05.12.2001



Alfred Ulenberg Freier Landschaftsarchitekt AKNW - Tel: 02834/8081 - Internet: [www.ulenberg.de](http://www.ulenberg.de)

Es ist beabsichtigt, dass Projekt bis **Ende August 2002** abzuschließen.

Infotelefon:

**Amt für Schule und Sport, Herr Seidler, 992332**

**Grünflächenamt, Herr Graf, 992470**
